




- Gestión Predictiva
- Gestión Ágil
- Comparativa
- Pasaje de PMI a Scrum
- Pasaje de Scrum a Kanban

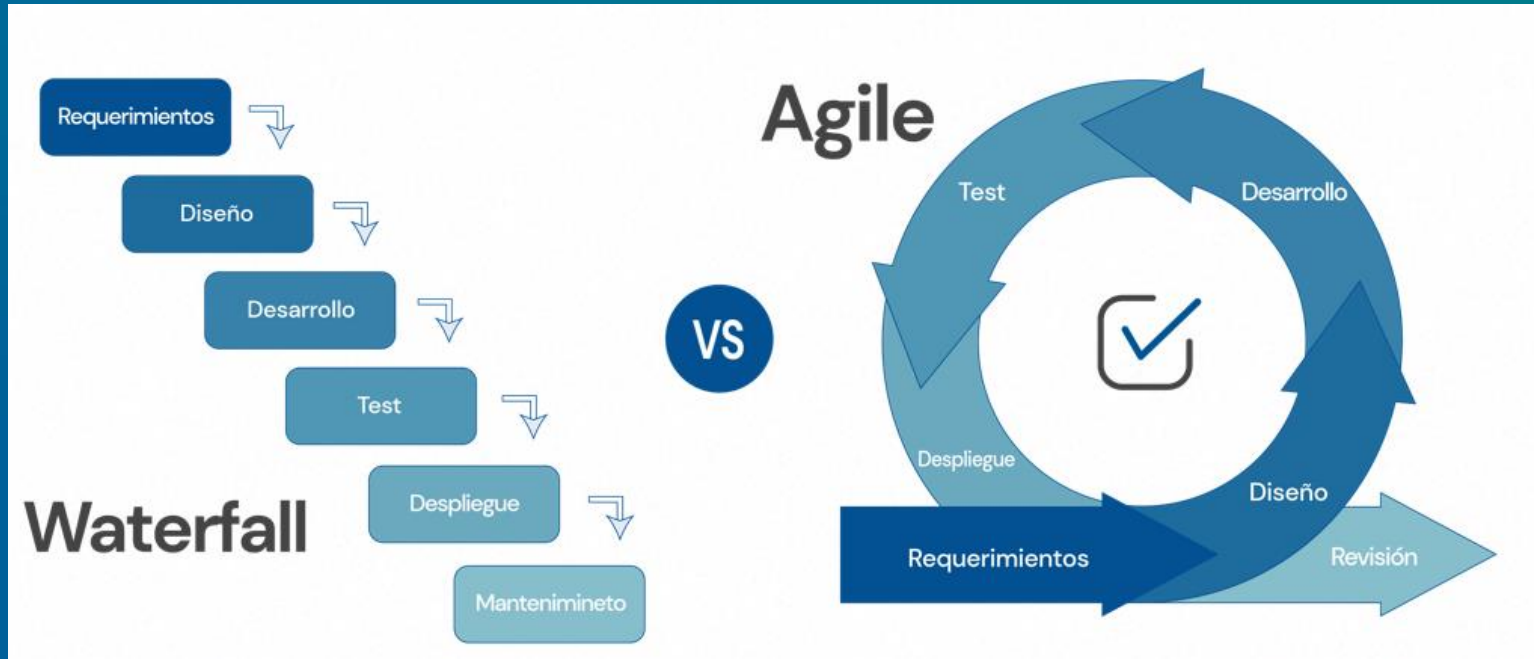

PMBOK

Project Management
Book of Knowledge

↓
Areas de
conocimiento

1. **Integración:** Coordina todos los aspectos del proyecto
2. **Alcance:** Define y controla el trabajo requerido
3. **Tiempo:** Programa y asegura la terminación en plazos adecuados
4. **Costos:** Planifica, estima y controla el presupuesto
5. **Calidad:** Asegura que el proyecto cumple con los estándares
6. **Recursos:** Gestiona los recursos humanos y materiales
7. **Comunicación:** Facilita la información y el intercambio entre interesados
8. **Riesgos:** Identifica, evalúa y mitiga riesgos
9. **Adquisiciones:** Gestiona las compras y contratos necesarios
10. **Interesados:** Gestiona expectativas e influencias de los interesados

PMI vs Agile

Ciclo de Vida de Desarrollo

PMI:

- Si bien en la práctica quienes eligen PMI tienen una tendencia a emplear ciclos cascada con grandes fases, la metodología da la posibilidad de utilizar fases pequeñas a medianas de acuerdo a la situación de aplicación.

Scrum:

- Utiliza ciclos iterativos e incrementales con iteraciones de entre una semana y un mes.

PMI vs Agile

PMI:

- Predice el trabajo de lo que se va hacer en cada fase, con ello se predice la duración de la fase. Predice un fin de proyecto, que puede variar con la aprobación de un “cambio” en duración, lo cual puede surgir por aumento o disminución de funcionalidad, por error en las estimaciones iniciales o por cambios propiamente dichos.

Scrum:

- Busca predecir lo que se va a hacer en el sprint actual en el tiempo pautado. Adapta su predicción con la experiencia del sprint anterior.

PMI vs Agile

Manejo del Alcance

PMI:

- Se define en forma detallada en fase de planificación. Durante la ejecución es monitoreado el proyecto, deja a definir en cada proyecto el nivel de comunicación necesario del avance para cada grupo de participantes. De acuerdo con esto surgen los pedidos de cambio para la modificación del Alcance.

Scrum:

- Define un backlog inicial de funcionalidades, y está previsto que este pueda cambiar de acuerdo a los pedidos del dueño del producto. Fija alta involucramiento del dueño del producto, y fija este rol como necesario para priorizar.

PMI vs Agile

Manejo de los Costos

PMI:

- Incluye la gestión de costos de proyectos. Indica distintos tipos de contratos para la contratación de proveedores. No incluye mecanismos para la contratación del proyecto en sí, ya que esto está fuera del alcance de PMBoK por ser considerado anteproyecto.

Agiles:

- No incluye el tratamiento de los costos directamente. El manejo de contratos en entornos ágiles suele ser complicado.

PMI vs Agile

Manejo de la Calidad

PMI:

- Incluye una unidad puntual en dónde define calidad, los procesos, herramientas, monitores, gráficos e indicadores, con el objetivo del aseguramiento de la calidad (QA) y su control (QC).

Scrum:

- La calidad está incluida implícitamente en sus procesos, al fijar prácticas que incluyen el rol de Scrum Master y su alta participación. Las retrospectivas y las cortas iteraciones generan un proceso de mejora continua. Las revisiones permiten asegurar parte de la calidad de las entregas. Fija el burndown chart, y una serie de indicadores de control.

PMI vs Agile

Trabajo en equipo y
comunicación

PMI:

- Incluye un grupo de procesos específico que detalla desde la planificación de la obtención de recursos humanos, pasando por, capacitación, teorías y técnicas de gestión de personal y equipos hasta su evaluación final a fin del proyecto. Tiene una herramienta puntual al finalizar la fase o contrato que es Lecciones Aprendidas: en esta los participantes indican fortalezas, oportunidades de mejora y acciones preventivas y correctivas.

Scrum:

- Otorga normativas sobre la gestión de equipos y las actitudes que deben existir.

PMI vs Agile

Normativas de Scrum sobre
la gestión de equipos

- Equipos entre 5 a 9 personas: esto facilita la formación del equipo por ser un grupo reducido.
- Reunión diaria, revisiones: facilita la interacción.
- Tablero de Actividades: Hace que uno acepte Cada persona acepta ante todos las actividades que va realizar, y queda a la vista cuando cumple y cuando no. Esto motiva la autogestión.
- Retrospectiva: ayuda a la autogestión porque da lugar a que todos propongan mejoras y que se comprometan a hacerlas.

PMI vs Agile

Impacto de su implementación
en la Organización

- Nuevos roles:
 - ✓ Tal vez no existan en los sectores actuales personas con el perfil necesario, se puede optar por capacitar o contratar nuevo personal.
- Nuevas actividades/ entregables de gestión
 - ✓ Capacitar al personal para entender el valor de estos entregables.

PMI vs Agile | Raci model

Impacto de su implementación
en la Organización



PMI vs Agile

Impacto de su implementación
en la Organización

Dedicar tiempos a la planificación, monitoreo y control

- ✓ El personal que no tiene incorporado una metodología de planificación ya sea porque no tiene capacitación, o porque no tiene experiencia en proyectos puede tomar estas actividades como pérdida de tiempo debido falta de visión.
- Monitoreo y Control
- ✓ En un primer momento la visualización del avance de las actividades suele ser resistencia al cambio.

PMI vs Agile

Impacto de su implementación
en la Organización

Dedicar tiempos a la generación de reportes

- ✓ o Puede ser considerado también una pérdida de tiempo. Hay que comunicar claramente cuál es el fin de cada uno (Ej. Toma de decisiones de la gerencia u otros fines).

Mantener indicadores de progreso

- ✓ Una idea común de los que trabajan en pequeñas actividades o trabajo operativo es que se puede compensar los atrasos con un poco más de esfuerzo, o algunas horas extras. Cuando los desvíos son de semanas los indicadores resaltaran la dificultad de hacer esto.

PMI vs Agile

Impacto de su implementación
en la Organización

Hacer público el estado del proyecto

- ✓ El equipo en si puede sentir la necesidad de no mostrar su avance en particular si es negativo.
- Mostrar los problemas y riesgos que se tienen
- ✓ El equipo tampoco suele notarse proclive a mostrar inicialmente los riesgos que existen y los problemas imprevistos que surgen. Si un proyecto no tiene tratamiento de los riesgos, lo más probable es que luego tenga problemas que podían haber sido evitados o mitigados.

PMI vs Agile

Impacto de su implementación
en la Organización

- No estar acostumbrado a trabajar en equipo
 - ✓ Suele ser necesario realizar actividades de equipo para tratar grandes grupos que solían trabajar aislados. El logro de trabajar en equipo es algo que no se obtendrá en el momento inicial, sino que se logrará iniciado el proyecto. Cuanto antes se logre los resultados más efectivos se obtendrán más rápidamente.
- Falta de comunicación
 - ✓ Falta de interés por comunicar y detectar quienes son los afectados por los cambios que cada integrante realiza.

PMI vs Agile

Impacto de su implementación
en la Organización

- Dificultad de trabajar en proyectos y en el trabajo continuo que da soporte al negocio.
- ✓ Problemas de prioridades entre las personas que están asignadas a un proyecto y a soporte operativo, debido a que este ultimo puede tener una demanda variable

Para lograr cualquiera de estas formas de gestión se debe tener un apoyo de la gerencia, una muy buena capacitación, comunicación de que se espera de cada uno y entender cuál es la motivación necesaria de la necesidad de utilizar una metodología.

PMI vs Agile

Impacto de su implementación
en la Organización

- Posibles Criterios de Elección

A la hora de elegir entre un enfoque ágil o predictivo, es necesario tener en cuenta varios criterios respecto a algunos atributos del proyecto. Se pueden mencionar los criterios siguientes:

- Priorización de los drivers del proyecto

En este caso es importante saber cuáles son las prioridades de los sponsors del proyecto: que se cumpla un plan (enfoque predictivo) o que se busque el producto que aporte mayor valor al negocio (enfoque ágil).

PMI vs Agile

- Volatilidad de los requerimientos

Si los requerimientos son muy bien definidos, estables y completos, es probable que un enfoque predictivo sea adecuado. Por lo contrario si muchos de los requerimientos se van a descubrir a lo largo del proyecto o probablemente cambien a medida que se avance, es recomendable un enfoque ágil.

Impacto de su implementación
en la Organización

PMI vs Agile

Impacto de su implementación
en la Organización

- Facilidad de prototipación y modificaciones

Si la plataforma tecnológica permite construir prototipos con poco esfuerzo y si eventuales cambios se pueden hacer fácilmente, es probable que el modelo ágil sea adecuado. Si al contrario la tecnología hace que los cambios son muy costosos, probablemente haya que ir a un enfoque predictivo y un ciclo cascada de desarrollo.

PMI vs Agile

Impacto de su implementación
en la Organización

- Involucramiento del Usuario

Poder involucrar a los usuarios en las practicas agiles es fundamental para su éxito. Existen proyectos donde por razones políticas o logísticas no se puede contar con este involucramiento. En tal caso la aplicación de metodologías agiles no tendría todos los beneficios esperados.

PMI vs Agile

Impacto de su implementación
en la Organización

- Tamaño o división del proyecto

En un proyecto donde sea fácil armar equipos de 5 a 9 personas muy cohesivas, se suele aplicar fácilmente metodologías ágiles como Scrum. Ahora si el proyecto es muy grande y los equipos no se pueden dividir fácilmente o tienen fuerte acoplamiento puede ser más complicado implementar enfoques ágiles por las necesidades de coordinación a alta escala.

PMI vs Agile

Impacto de su implementación
en la Organización

- Priorización de los drivers del proyecto

En este caso es importante saber cuáles son las prioridades de los sponsors del proyecto: que se cumpla un plan (enfoque predictivo) o que se busque el producto que aporte mayor valor al negocio (enfoque ágil).

Cambiar de PMI a Scrum

- Cambio Predicción a Adaptación, no existe una fecha fin de proyecto al inicio de este.
- Cambio de esquema de seguimiento de semanal a diario. Esto implica una alta disciplina para su realización.
- Las personas deben asimilar la planificación por sprint con time boxing.
- Las personas deben enfocarse a través del Burndown chart en el seguimiento del esfuerzo restante.

Cambiar de PMI a Scrum

- Traslado de responsabilidad de control del líder a autogestión de los que realizan los trabajos en sí.
- Al trabajar con tablero también se tiene que tener en cuenta que cualquiera que tenga acceso a la sala ubicado donde esta podrá saber el estado del proyecto (confidencialidad).
- De acuerdo al tamaño del proyecto puede existir la necesidad de más de un equipo de seguimiento diario, y luego debe contemplarse además de la realización de reuniones diarias de cada equipo, la realización de reuniones diarias entre referentes de cada equipo. Este es seguimiento entre equipos llamado scrum de scrums.

Cambiar de PMI a Scrum

- El cambio más fuerte suele ser el pasaje de Predictivo a Adaptativo, ya que suele ser muy necesaria para el negocio la fecha fin del proyecto. El problema es que realmente en muchas ocasiones esta no puede ser estimada.

Cambiar de PMI a Scrum


- Hay muchas situaciones en que el pasaje de uno a otro suele ser por partes, iniciando por las reuniones diarias, tomando el cronograma por sprints, etc... para cualquiera de estos casos híbridos es aconsejable monitorear que objetivos quieren cumplirse sine qua non y cuáles son los esfuerzos que pueden sumarse luego. En algunas ocasiones puede parecer que se está implementando Scrum pero en realidad se está utilizando PMI "vestido de Scrum", por ejemplo, si no existe un sprint, si se controla fecha fin de cada una de las tareas, si se actualiza todos los días el cronograma. En ese caso se obtienen solo beneficios de la reunión diaria y de la visualización en el tablero, pero se cuenta con un aumento en la gestión por tener parte de ambos.

Cambiar de PMI a Scrum

- Cuando se implementa Scrum en equipos que no tenían otra experiencia previa de PMI suele ser más fácil, dado que quienes tenían experiencia en PMI tienen tendencia a buscar ciertos conceptos que ya no son necesarios en Scrum, como por ejemplo el día que finaliza una tarea, el trabajo a tener que hacer dentro de 3 meses. Esto suele traer una sensación de inseguridad en las personas debido a que no se pueden aferrar a lo que ante eran sus pilares.

Qué es Kanban

Work in
progress (WIP)
limits

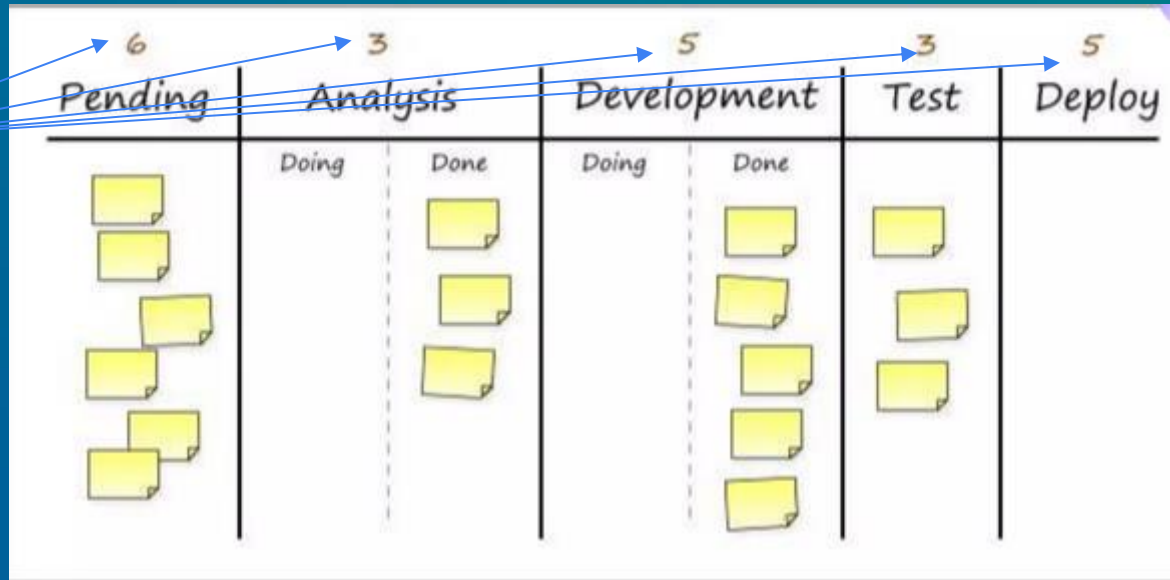

Cambiar de Scrum a Kanban

- Una vez implementado Scrum se puede implementar Kanban, básicamente transformando el tablero para que represente el flujo de trabajo, agregando el límite de Trabajo en Progreso y luego optimizar el flujo. El otro agregado para lograr esto es implementar los indicadores de Kanban.
- Si se quiere solo mantener las prácticas de Kanban, luego se deben quitar las practicas relacionadas con sprint, su selección de funcionalidades y sus indicadores. La práctica de retrospectiva es muy útil, estas se pueden decidir hacer cada cierto periodo de tiempo más allá de que no exista un sprint.

¿Preguntas?

